

宮内新浜作業所



現場 千葉県 市川

施工 大日本土木(株)


機種 MKW-55SVH (流動化面板使用)
35SVHII (流動化面板使用)

配管長 80m/200m

配管径 6インチ

打設量 1日打設 150m³

備考 池のヘドロ掃除に使用
2台中継

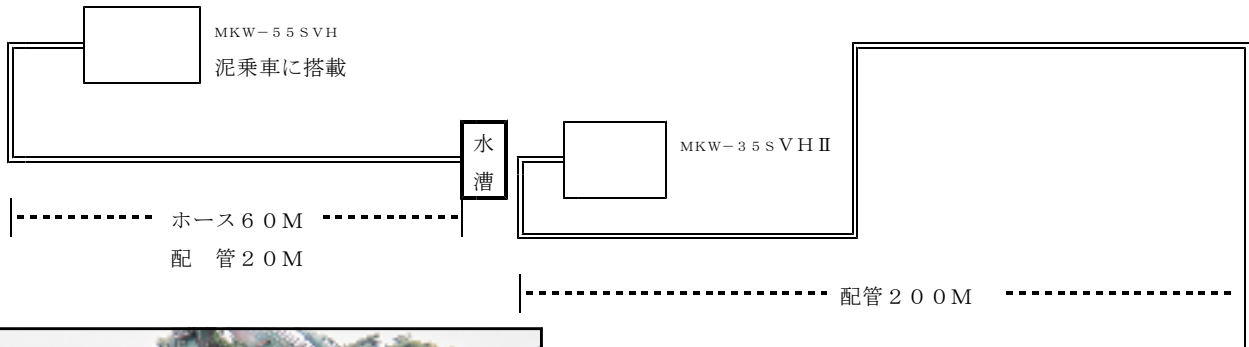

水槽をホッパーにしポンプで吸い込みし圧送。

ヘドロ捨て場



水槽でヘドロを受けて、流動化面板台を使用し吸い込み圧送



左右の吸い込み管にて、ホース等にて水槽より直接材料を吸い込む特殊装置
